


Kursusprogram: Tidlig Kvalitetssikring af Projekter



Praktisk Teori & Træning – Bæredygtige Projekter

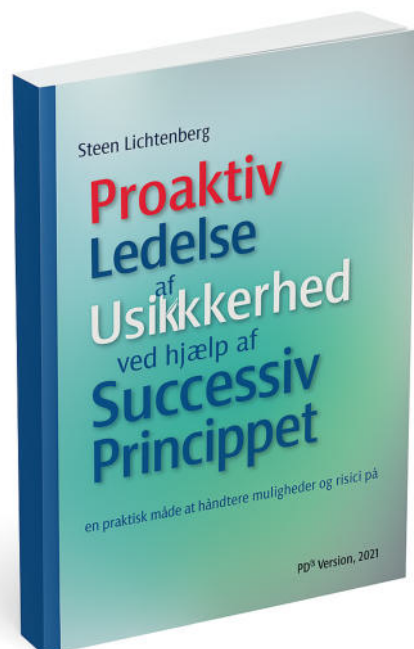

Kursusprogram Teori & Træning



SP1: Introduktion til Successiv metoden.

SP2a: Praktisk anvendelse af Successiv metoden

SP2b: Praktisk anvendelse af Successiv metoden i IT projekter

SP2c: Praktisk anvendelse af Successiv metoden i bygge projekter


SP3: Praktisk facilitering – Teori & træning

SP4: Analyse af tidsplaner – Teori & træning

SP5: Analyse af Business Cases – Teori & træning

SP6: Analyse af Porteføljer – Teori & træning

Kurserne og træningen giver grundlag for at blive certificeret.
Sparring og træning aftales på de enkelte hold.



SP1: Introduktion til Successiv metoden.

Mål:

- At give en generel intro til usikkerhedsanalyser
- At give en generel intro til Successiv Princippet
- At deltageren har forstået metoden
- At deltageren kan udføre en ikke kompleks usikkerhedsanalyse



Udbytte:

- Indsigt og forståelse af usikkerhedsanalyser:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - Sammensætning af analysegrupper
 - Anvendt statistik og matematik
 - S-kurven og Top10 listen
 - Adskillelse af leverancer og omgivelser
 - Værdifulde referencer
- Evne til at gennemføre en mindre analyse sammen med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 1, SPC s16)



Komp. 1: Ikke kompleks analyse

Et mindre ikke komplekst projekt, få interessekonflikter,
5-8 analysedeltagere

Budget: 0,1 - 1 Mill. € og varighed ½ - 1 år.



Kursus: 2 dage + 3t **opfølgning** på Teams

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 1.2 Projektledelse og styring generelt
- Ke 1.3 Risk management
- Ke 1.4 Økonomistyring
- Ke 2.1 Baggrund og historik
- Ke 2.2 Teori – Matematik & Statistik
- Ke 2.3 Teori – Baising/påvirkning
- Ke 3.1 Overordnet workshop forberedelse
- Ke 3.2 Analysegruppen
- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.5 Analyse af omkostninger
- Ke 3.8 Rapportering
- Ke 3.11 Skalering og implementering
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.2 Faciliteringsteknikker
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden
- Ke 4.4 Facilitering af workshops



SP2a: Praktisk anvendelse af Successiv metoden

Mål:

- At give en dybere forståelse af Successiv Princippet
- At give en dybere forståelse for den praktiske anvendelse
- At deltageren kan udføre mindre kompleks usikkerhedsanalyse med assistance



Udbytte:


- En dybere indsigt og forståelse af usikkerhedsanalyser:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel dybere indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - Sammensætning af analysegrupper
 - Anvendt statistik og matematik
 - S-kurven og Top10 listen
 - Adskillelse af leverancer og omgivelser
 - Værdifulde referencer
- Evne til at gennemføre en mellemstor analyse med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 2, SPC s16)



Komp. 2: Mindre kompleks analyse

Et mindre og komplekst projekt, nogen interessekonflikter, 8-10 analysedeltagere

Budget: 1 - 10 Mill. € og varighed 1 - 3 år.



Kursus: 2 dage + 3t **opfølgning** på Teams

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 2.2 Teori – Matematik & Statistik
- Ke 2.3 Teori – Baising/påvirkning
- Ke 3.1 Overordnet workshop forberedelse
- Ke 3.2 Analysegruppen
- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.5 Analyse af omkostninger
- Ke 3.8 Rapportering
- Ke 3.9 Programmer
- Ke 3.10 Monte Carlo-Simuleringer
- Ke 3.11 Skalering og implementering
- Ke 3.12 Kunstig Intelligens
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.2 Faciliteringsteknikker
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden
- Ke 4.4 Facilitering af workshops
- Ke 4.5 Selv-refleksion og ledelse
- Ke 4.6 Konflikter & kriser



SP2b: Praktisk anvendelse af Successiv metoden i IT projekter

Mål:

- At give en dybere forståelse af Successiv Princippet
- At give en dybere forståelse for den praktiske anvendelse i IT projekter
- At deltageren kan udføre mindre kompleks usikkerhedsanalyser med assistance



Udbytte:

- En dybere indsigt og forståelse af usikkerhedsanalyser:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel dybere indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - Sammensætning af analysegrupper
 - Anvendt statistik og matematik
 - S-kurven og Top10 listen
 - Adskillelse af aktiviteter og omgivelser
 - Technical Enabler, Rework, Refactoring, Bugfix m.v.
- Evne til at gennemføre en mellemstor analyse med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 2, SPC s16)



Komp. 2: Mindre kompleks analyse

Et mindre og komplekst projekt, nogen interessekonflikter, 8-10 analysedeltagere

Budget: 1 - 10 Mill. € og varighed 1 - 3 år.



Kursus: 1 dag + 3t **opfølgning** på Teams

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 1.5 Agile projekter
- Ke 2.2 Teori – Matematik & Statistik
- Ke 2.3 Teori – Baising/påvirkning
- Ke 3.1 Overordnet workshop forberedelse
- Ke 3.2 Analysegruppen
- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.5 Analyse af omkostninger
- Ke 3.8 Rapportering
- Ke 3.9 Programmer
- Ke 3.10 Monte Carlo-Simuleringer
- Ke 3.11 Skalering og implementering
- Ke 3.12 Kunstig Intelligens
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.2 Faciliteringsteknikker
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden
- Ke 4.4 Facilitering af workshops
- Ke 4.5 Selv-refleksion og ledelse
- Ke 4.6 Konflikter & kriser



SP2b: Praktisk anvendelse af Successiv metoden i bygge projekter

Mål:

- At give en dybere forståelse af Successiv Princippet
- At give en dybere forståelse for den praktiske anvendelse i bygge projekter
- At deltageren kan udføre mindre komplekse usikkerhedsanalyser med assistance



Udbytte:

- En dybere indsigt og forståelse af usikkerhedsanalyser:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel dybere indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - Sammensætning af analysegrupper
 - Anvendt statistik og matematik
 - S-kurven og Top10 listen
 - Adskillelse af leverancer og omgivelser
 - Værdifulde referencer
- Evne til at gennemføre en mellemstor analyse med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 2, SPC s16)



Komp. 2: Mindre kompleks analyse

Et mindre og komplekst projekt, nogen interessekonflikter, 8-10 analysedeltagere

Budget: 1 - 10 Mill. € og varighed 1 - 3 år.



Kursus: 1 dag + 3t **opfølgning** på Teams

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 2.2 Teori – Matematik & Statistik
- Ke 2.3 Teori – Baising/påvirkning
- Ke 3.1 Overordnet workshop forberedelse
- Ke 3.2 Analysegruppen
- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.5 Analyse af omkostninger
- Ke 3.8 Rapportering
- Ke 3.9 Programmer
- Ke 3.10 Monte Carlo-Simuleringer
- Ke 3.11 Skalering og implementering
- Ke 3.12 Kunstig Intelligens
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.2 Faciliteringsteknikker
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden
- Ke 4.4 Facilitering af workshops
- Ke 4.5 Selv-refleksion og ledelse
- Ke 4.6 Konflikter & kriser



SP3: Praktisk facilitering – Teori & træning

Mål:

- At give en dybere forståelse af Successiv Princippet
- At give en dybere forståelse for den praktiske anvendelse i IT projekter
- At deltageren kan udføre mindre kompleks analyse med assistance

Udbytte:

- En dybere indsigt og forståelse af usikkerhedsanalyser:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel dybere indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - Sammensætning af analysegrupper
 - Anvendt statistik og matematik
 - S-kurven og Top10 listen
 - Adskillelse af leverancer og omgivelser
 - Værdifulde referencer
- Evne til at gennemføre en mellemstor analyse med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 2, SPC s16)

Komp. 2: Mindre kompleks analyse

Et mindre og komplekst projekt, nogen interessekonflikter, 8-10 analysedeltagere

Budget: 1 - 10 Mill. € og varighed 1 - 3 år.



**Kursus: 1 dag + 1 workshop +
3t opfølgning på Teams**

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 3.1 Overordnet workshop forberedelse
- Ke 3.2 Analysegruppen
- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.11 Skalering og implementering
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.2 Faciliteringsteknikker
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden
- Ke 4.4 Facilitering af workshops
- Ke 4.5 Selv-refleksion og ledelse
- Ke 4.6 Konflikter & kriser



SP4: Analyse af tidsplaner – Teori & træning

Mål:

- At give en dybere forståelse for usikkerhedsanalyse af tidsplaner (varighed)
- At deltageren kan udføre mindre kompleks analyse af tidsplaner med assistance



Udbytte:

- En dybere indsigt og forståelse af usikkerhedsanalyser:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel dybere indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - Sammensætning af analysegrupper
 - Anvendt statistik og matematik
 - S-kurven og Top10 listen
 - Adskillelse af aktiviteter, afhængigheder og omgivelser
- Evne til at gennemføre en mellemstor analyse af tidsplaner med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 2, SPC s16)



Komp. 2: Mindre kompleks analyse

Et mindre og komplekst projekt, nogen interessekonflikter, 8-10 analysedeltagere

Budget: 1 - 10 Mill. € og varighed 1 - 3 år.



**Kursus: 1 dag + 1 workshop +
3t opfølgning på Teams**

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 3.1 Overordnet workshop forberedelse
- Ke 3.2 Analysegruppen
- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.6 Analyse af tidsplaner
- Ke 3.8 Rapportering
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.2 Faciliteringsteknikker
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden
- Ke 4.4 Facilitering af workshops
- Ke 4.5 Selv-refleksion og ledelse
- Ke 4.6 Konflikter & kriser



SP5: Analyse af Business Cases – Teori & træning

Mål:

- At give en dybere forståelse for usikkerhedsanalyse af Business Cases
- At deltageren kan udføre mindre kompleks analyser med assistance



Udbytte:

- En dybere indsigt og forståelse af usikkerhedsanalyser:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel dybere indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - S-kurver og Top10 listen
 - Adskillelse af indtægter og udgifter
 - Amortisering, Diskontering m.v.
- Evne til at gennemføre en mellemstor analyse af en Business Case med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 2, SPC s16)



Komp. 2: Mindre kompleks analyse

Et mindre og komplekst projekt, nogen interessekonflikter, 8-10 analysedeltagere

Budget: 1 - 10 Mill. € og varighed 1 - 3 år.



**Kursus: 1 dag + 1 workshop +
3t opfølgning på Teams**

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.7 Analyse af Business Cases
- Ke 3.8 Rapportering
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.2 Faciliteringsteknikker
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden



SP6: Analyse af Porteføljer – Teori & træning

Mål:

- At give en praktisk forståelse for usikkerhedsanalyser af porteføljer
- At deltageren kan opsætte en analyse for en portefølje i mindre komplekse analyser med assistance



Udbytte:

- En forståelse for anvendelse i metoden i porteføljer:
 - Fordele, ulemper, processer og faldgruber
- En generel dybere indsigt i Successiv Princippet:
 - Fordele, ulemper og faldgruber
 - Analyseprocessen og grundlæggende facilitering
 - Anvendt statistik og matematik
- Evne til at gennemføre en analyse af en portefølje med erfaren sparringspartner (Kompleksitet 2, SPC s16)



Komp. 2: Mindre kompleks analyse

Et mindre og komplekst projekt, nogen interessekonflikter, 8-10 analysedeltagere

Budget: 1 - 10 Mill. € og varighed 1 - 3 år.



**Kursus: 1 dag + 1 workshop +
3t opfølgning på Teams**

SPC bogen: Berørte kompetence-elementer (KE):

- Ke 1.1 Portefølje og programledelse
- Ke 1.2 Projektledelse og styring generelt
- Ke 1.3 Risk Management
- Ke 1.4 Økonomistyring
- Ke 2.2 Teori – Matematik og statistik
- Ke 3.3 Kvalitativt proces (Beskrivelser)
- Ke 3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)
- Ke 3.8 Rapportering
- Ke 3.13 Tolkning og anvendelse
- Ke 4.1 Forberedelse
- Ke 4.3 Faldgruber i metoden





Praktisk træning: Udføres som sidemandsoplæring





Undervisningsform

Fotos fra tidligere



Generelt om undervisning:

- Introduktion til emner
 - Slides, whiteboard, PostIts
 - Videoer
 - Cases
 - Referencer til SP Certificeringen
- Dialoger i 2&2 grupper
- Erfaringsudveksling
- Fysisk / Webinar
- Hjemme opgaver
- Opfølgning via webinar

Fortæl mig, og jeg glemmer.

Vis mig, og jeg husker.

Involver mig, og jeg forstår.

Konfutses (Kinesisk filosof 551-479)



Se video på YouTube kanalen:
"Risk Management & EBIT Styring"





Kompetence bogen SP certificering



VI SIKRER KOMPETENTE FACILITATORER...

Fordele for dig

- Øget bevidsthed om dine kompetencer
- Forbedring af dine kompetencer
- En plan for kompetenceforbedringer
- En uafhængig blåstempling af dine kompetencer

Fordele for virksomheden

- En sikkerhed for, at analyser udføres af en kompetent facilitator/deltager
- Uvildig vurdering og eksaminering af facilitators kompetencer
- Mulighed for at vælge facilitator efter projekt-kompleksitet
- Professionel certificering

...OG SIKRER KVALITETEN

Vi sikrer

- At dine kompetencer evalueres
- At certificeringen er uvildig
- At certificeringen er ensartet

Vi samarbejder med

- Erfarne skandinaviske assessorer
- Andre certificeringsudbydere


Vi tilbyder

- Sparring med andre under certificeringen
- Certificering på dansk

Vores assessorer har

- Mellem 15 og 30 års erfaring
- Gennemført mellem 100 og 300 analyser
- Analyseret omkostninger, tidsplaner, og porteføljer. Fx af IT, byggeanlæg, jernbaner, energi-anlæg, produkter m.v.

OM SUCCESSIV PRINCIPPET
"Kombination af sund
fornuft og videnskab"
Professor Ole Jonny Klakegg, NTNU



INDHOLD

Hvad indeholder den?

- En ansøgning
- En egen kompetence-vurdering
- En skriftlig eksamen
- En case beskrivelse *
- Et interview *
- En live case analyse *

* gælder kun for nogle certificeringer

FORDELE

- Uafhængig certificering
- Erfarne assessorer
- Struktureret vurdering
- Kompetenceudvikling
- Værdifulde certifikater

Kompetencer

Gennem certificeringen styrkes dine analysekompetencer

Kvalitet

Certificeringen sikrer virksomheden en høj kvalitet af analyse, proces og resultat

Øget overskud

Virksomheden opnår bedre styring af projekter og overskud ved at bruge certificerede facilitatorer

NIVEAUER

Facilitator eller deltager

Man kan blive certificeret som facilitator:

- Niveau D: Metoden
- Niveau C: Facilitator
- Niveau B: Seniorfacilitator
- Niveau A: Underviser

Kravene til de enkelte niveauer beskrives i introduktionsmaterialet.

Niveau B, C og D tilbydes også for analysedeltagere.

OM SUCCESSIV PRINCIPPET
"Metoden er praktisk, forståelig & nyttig.
Den har stor strategisk potentiale"
Professor Ole Jonny Klakegg, NTNU

- LÆSE MERE OM:**
- Certificeringsforløbet
 - Krav til niveauerne
 - Indholdet i SPC bogen
 - Relevante bøger
 - Uddannelse i metoden
 - Priser m.v.

Læs mere på COMPILOT.dk



Bestil folderen på Mail@Compilot.dk

2025-Aug.

Kvalitetssikring af projekter

SPC bogen - Indhold

Ke.1 PROJEKTLEDELSE			
Ke.1.1 Portefølje og programledelse - Virksomhedens modenhed og aktuelle brug af dette - Styringsmekanismer, relationer til aktuelle analyser m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.1.2 Projektledelse og styring generelt - Projektmodeller, scoping, kravstyring m.v. - Organisering, ressourcestyring, interessenter m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.1.3 Risk Management - Identificering, håndtering, vurdering, uddelegering - Estimering, beregninger, handlingsplaner m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.1.4 Økonomistyring - Økonomistyring, finansiering og allokering - Organisering, nøglebegreber, link til aktuelle analyser m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.1.5. Agile projekter - Definitioner, ledelse og styringsmetoder - Udførelse af agile projekter - SAFe og andre tilgange til agilt set up .		VIDEN	PRAKSIS

Grundliggende kendskab til disse områder - for at kunne forstå og tilgå projekt verdenen.

Grundliggende kendskab til disse områder for at kende til Successiv metoden.

Ke.2 BAGGRUND OG TEORI			
Ke.2.1 Baggrund og historik - Baggrund for Successiv Kalkulation og Princippet - Formidling, tilpasning, nye anvendelser og udvikling m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.2.2 Teori – Matematik & Statistik - Grundlæggende statistik, Bayersk teori, repræsentative tal - Statistiske funktioner: Fordele og begrænsninger - Estimeringsmetoder, -teknikker og -beregninger m.v. - Matematik formler og anvendte beregninger	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.2.3 Teori – Biasing/påvirkning - Virksomheden, medier, eksterne forhold/data - Kulturer, virksomhedstyper, grupper og individer - Bevidste og ubevidste påvirkninger, opfattelse af data m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS

Ke.3 SUCCESSIV ANALYSE

Ke.3.1 Overordnet workshop forberedelse

- Workshop-program, den successive analyse proces
- Forberedelse af fx beslutningstagere og analysegruppen m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.2 Analysegruppen

- Sammensætning, backup, omkostning ved deltagelse
- Kommunikation, personprofiler, gruppedynamik m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.3 Kvalitativ Proces (beskrivelser)

- Beskrivelse og kvalitetssikring af: Formål og mål, planlægningsreferencen, forudsætninger, scenarier
- Usikkerheder: Nøgleord, gruppering, m.v.
- Generelle og lokale usikkerheder
- Beskrivelse af hovedleverancer og faktorer for best case og worst case

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.4 Kvantitativ proces (Tal & beregninger)

- Planlægningsreferencens arbejdsplaner & leverancer
- Detaljeringsprocessen, trappefunktioner
- Sandsynlighedsfunktioner, korrelationer, faktorer
- Middel, varians, konfidensinterval
- S-kurven, Top10 listen m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.5 Analyse af omkostninger

- Identificering af omkostninger, investeringer, WBS
- Fastsettelse af budgetter på projekter/porteføljer
- Beregninger, illustreringer, kommunikation m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.6 Analyse af tidsplaner

- Tidsplaner, tidsanalyser, netværksdiagram, Gantt
- Kritiske veje, slæk, fletningshændelse m.v.
- Beregninger, påvirkning fra fletningshændelse m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.7 Analyse af Business Cases

- Opbygning, detaljering og tidsmæssig fordeling
- Diskonteringsmodeller, beregninger m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.8 Rapportering

- Strukturering af input data og resultater
- Rapportering på forskellige niveauer i organisationer, virksomheder og kulturer m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.9 Programmer

- Regneark, special programmer
- Kvalitetssikring af program, input og resultater m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.10 Monte Carlo-Simuleringer

- Baggrund, teori, metoder og modeller
 - Dataanalyse, sandsynlighedsfunktioner
 - Metoder for analyse af omkostninger, varighed, business cases
- Programmer

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.11 Skalering & implementering

- Skalering til forskellige kompleksiteter
- Implementering af metoden
- Virksomhedens modenhedsniveau m.v.

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.12 Kunstig Intelligens

- AI som assistent i analyseprocessen
- Tilpasse AI specifik hjælp i analyser
- Praktisk brug: Prompting, AI-agenter, AI-politik

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Ke.3.13 Tolkning og anvendelse

- Tolkningmuligheder og anvendelse til beslutningsstøtte m.v.
- Anvendelse af resultater fra forskellige typer af analyser, fx omkostninger, tid, Business Cases, agile projekter, porteføljer
- Beskrivelser i analyserapporten mht. tolkning og anbefalinger om anvendelse

REFERENCER

VIDEN

PRAKSIS

Specifik viden indenfor Successiv Principper.



Ke.4 FACILITERING AF SUCCESSIV ANALYSER			
Ke.4.1 Forberedelse • Analysesponsor, analysegruppen, baggrundsinfo • Workshop program, selve faciliteringen • Adgang til og deling af data, fysisk og virtuel set ups • Lokaler, plots, udstyr, filer m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.4.2 Faciliteringsteknikker • Personer og grupper. Refleksionsmetoder • Konflikter, motivering, interventioner, læring m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.4.3 Faldgruber i metoden • Forberedelsen, workshoppen, gruppeprocesser og rapportering, påvirkninger (Bias) • Planlægningsreferencen, beregninger, S-kurve, Top10 listen m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.4.4 Facilitering af workshops • Selve facilitering af analysen • Kulturforskelle, kommunikation, kvalitativ (beskrivelser) og kvantitativ fase (tal), dokumenter m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.4.5 Selv-refleksion og -ledelse • Selv-refleksion og -ledelse, tankeprocesser • Kropssprog, egne styrker/svagheder • Integritet, personlig læring og udvikling m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS
Ke.4.6 Konflikter og kriser • Konflikt- og krise-modeller • Forudse, forberede og afværge • Mediering, læring m.v.	REFERENCER	VIDEN	PRAKSIS

Specifik viden indenfor facilitering af Successiv Principet.


Kilde: Struktur, IPMA Danmark.



Undervisning & Viden

Konferencer, YouTube & Certificering

Nogle af dem vi er....

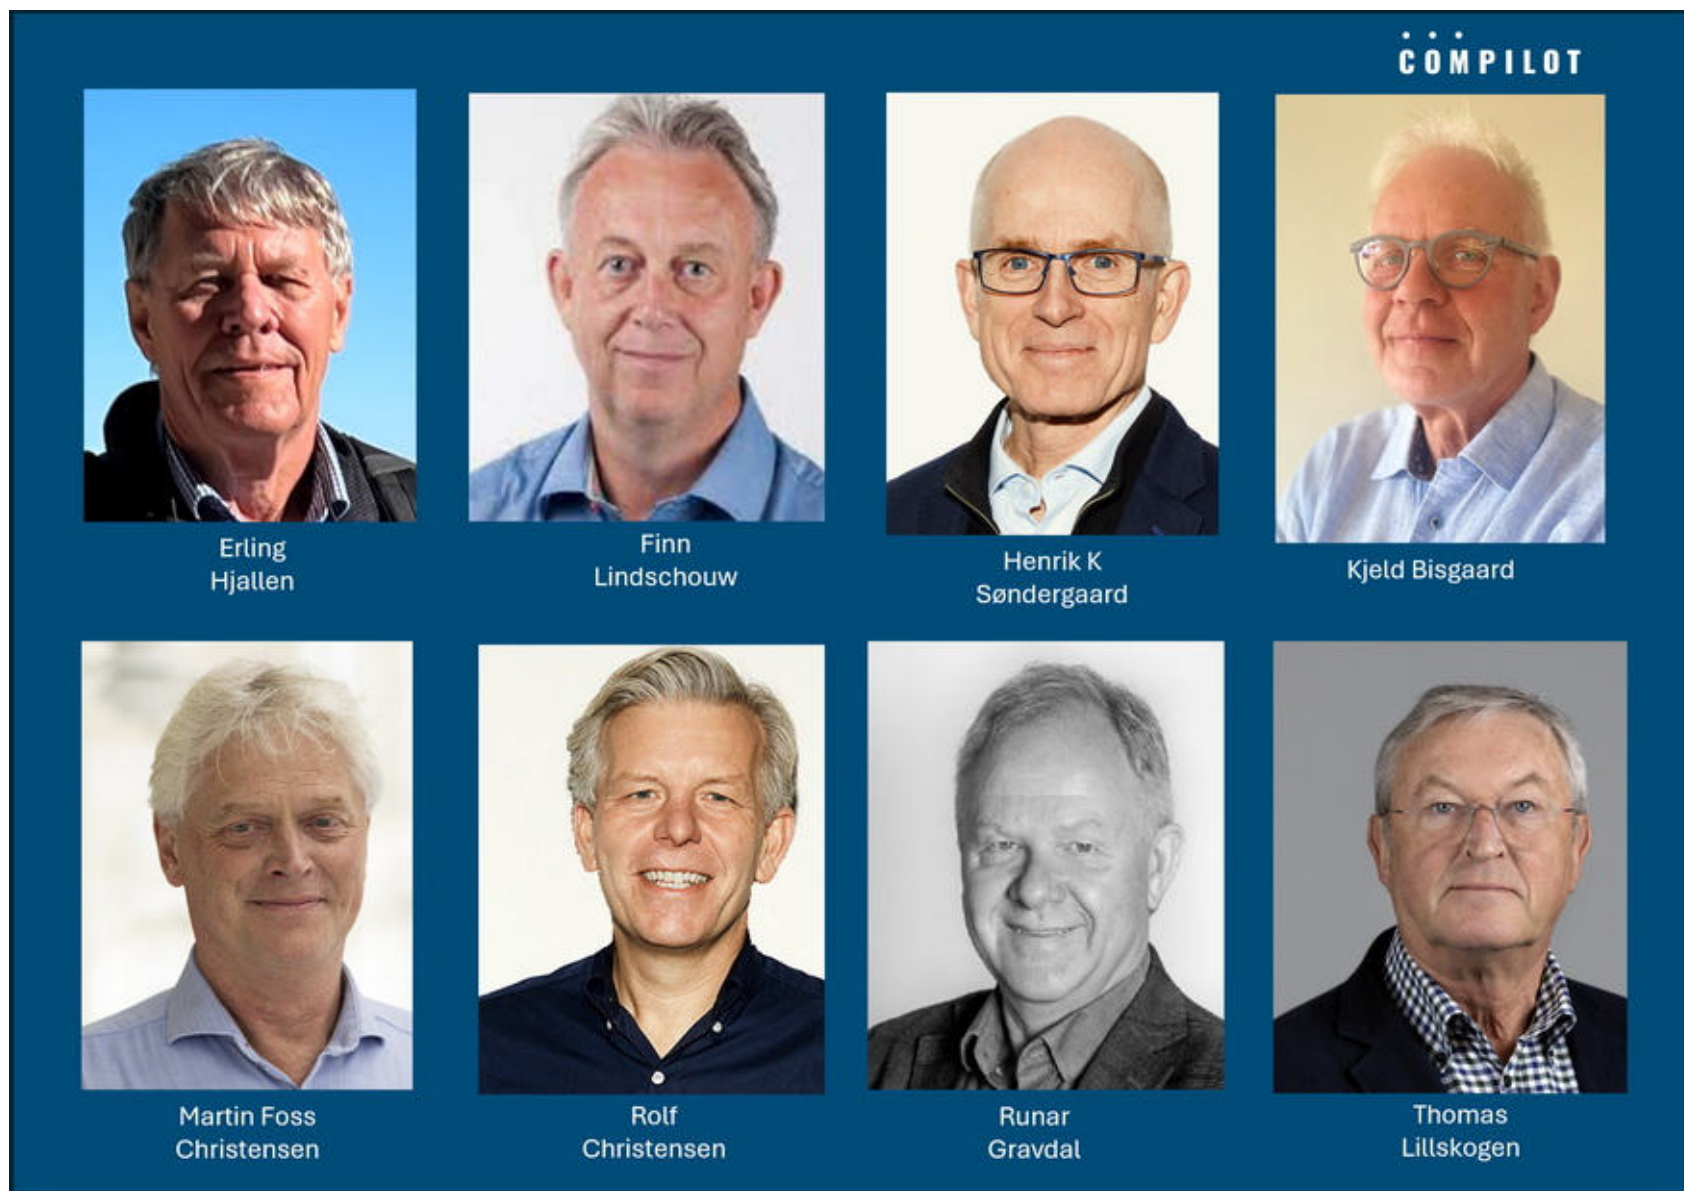

WORKSHOP

- INTRO
- OVERORDNEDE FAKTORER: BRAINSTORMING
- OFERE GRUPPERING
- ESTIMERING: LEVERANCERNE
- OFERE: ESTIMERING
- NEDBRYD & ESTIMER
- HANDLINGSPLANER
- PRÆSENTATION

Hvordan virker det?

Know Knowns

- Planlægnings-referencer
- Lev. 1
- Lev. 2
- Lev. 3
- ...
- Lev. 99

Unk Unks

- Lev.(1)
- Lev.(2)
- Lev.(3)
- ...
- Lev.(n)

OMGIVELSENE

- Kravstyr.
- Kontrakter
- Planlægning
- Projektmodel
- Uddannelse
- Projektorganisation
- Lovgivning
- Kvalitetsstyr.
- Kompetencer & erfaringer
- Fysiske grænseflader
- Authorities
- Politikere
- Supervis
- Analysgruppen
- Geografisk indeks
- By
- Dokumentstyr.
- Slutbrugere
- Vejret
- Rådgivere
- Bygepris indeks
- Risk Management
- Devaluering & inflation

Overall Faktorer

	Min	M.S.	Max
A) Komp & Erfa			
B) Interessenter			
C) Projektlede			
D) Kravstyring			
E) ...			
Z) Analyse-usikkerhed			

Planlægningsref.

	Min	M.S.	Max
Lev. 1			
Lev. 2			
Lev. 3			
...			
Lev. 99			

80-90% Usikkerhed

Planlægningsref.

$\Sigma \text{Middel(Lev.)} = 200 \text{ Mill.}$

$1\% = 2 \text{ Mill.}$

Underviser
Henrik K Søndergaard



Underviser
Rolf Christensen

TIDLIG KVALITETSSIKRING & ROBUSTE PROJEKTER



Videos are subtitled – and can be autotranslated to English and other languages.



Risk Management & EBIT Styring

40 abonnenter

TILPAS KANAL

ADMINISTRER VIDEOER

START


VIDEOER

PLAYLISTER

KANALER

DISKUSSIONER

OM




BÆREDYGTIGE PROJEKTER & BUNDLINJER
| SUSTAINABLE PROJECTS & BOTTOM...



BREDSPEKTRERE
ANALYSEGRUPPER - KOM HELE...



TIDLIGE USIKKERHEDSANALYSER -
PROCESSEN



TIDLIG KVALITETSSIKRING - VÆLG
ROBUSTHED MED S-KURVEN.



ROBUSTE BUDGETTER & PLANER -
INTRODUKTION TIL EN METODE.



TIDLIG KVALITETSSIKRING - FIND
DE 10 VIGTIGSTE BLANDT 1000



Interview: Professor Ole Johnny
Klaegg, NTNU, Norge om...



EARLY UNCERTAINTY ANALYSIS OF
PLANS - ROBUST PLANS



COMPILOT - Netværk med stærke
kompetencer og erfaringer



TIDLIG KVALITETSSIKRING:
FORSKELLIGE ROLLER &...



ROBUSTE BYGGEPROJEKTER -
TIDLIG KVALITETSSIKRING




TIDLIG KVALITETSSIKRING -
ROBUSTE PLANER.



Successiv Principet interview:
Virksomhedssejer Thomas Kingo...



INTERVIEW: TEKNISK DIREKTØR
LEIF LINDBERG - SUCCESSIV...



BUDGETRESERVER: KLAR, PARAT,
START



APPETIZER: TIDLIG
KVALITETSSIKRING AF BUDGETT...



GRATIS WEBINAR: ROBUSTE
BUDGETTER & UNKNOWN...




ESTIMER DET UFORDSEELIGE - KOM
TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN



EFFEKTIVE RISK ANALYSE
WORKSHOPS - RAM REGISTERET



INTERVIEW: CEO KLAUS
BJØRNSTAD - SUCCESSIV...



The Successiv Principet. Interview
Jeremy Fitton, CEO, Skylifter.Eu

